


SCRUM

INGENIERIA DEL SOFTWARE I

Lic. E. Alejandra Matoso

Scrum

- Scrum es uno de los métodos ágiles más populares. Es un marco de trabajo adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz, diseñado para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del proyecto.

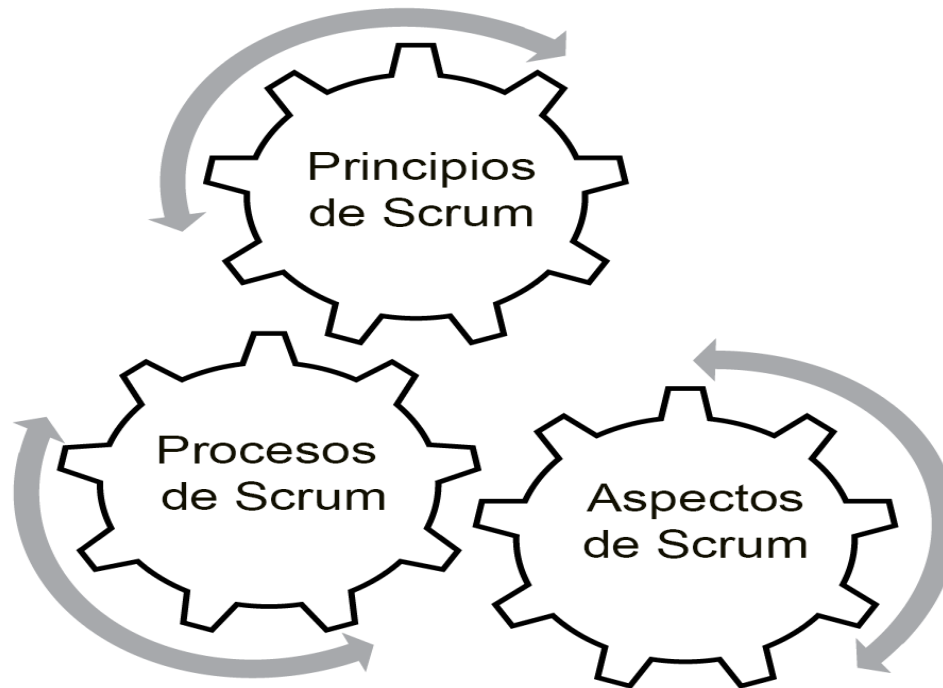

Principios de scrum

Los principios de Scrum son los lineamientos básicos para la aplicación del marco de trabajo de Scrum y deben implementarse de manera obligatoria en todos los proyectos Scrum:

- 1. Control del proceso empírico (*Empirical Process Control*)
- 2. Autoorganización (*Self-organization*)
- 3. Colaboración (*Collaboration*)
- 4. Priorización basada en valor (*Value-based Prioritization*)
- 5. Time-boxing
- 6. Desarrollo iterativo (*Iterative Development*)

Aspectos de scrum

Los aspectos de Scrum deben abordarse y gestionarse durante todo un proyecto Scrum:


- **1. Organización:** Entender los roles y responsabilidades definidos en un proyecto Scrum es muy importante a fin de asegurar la implementación exitosa de Scrum. Los roles de Scrum se dividen en dos amplias categorías: roles centrales (Product Owner, Scrum Master, y Equipo Scrum) y roles no centrales (interesados del negocio, clientes, usuarios y patrocinador/sponsor) .
- **2. Justificación del negocio:** Es importante que una organización lleve a cabo una evaluación adecuada del negocio antes de iniciar cualquier proyecto.
- **3. Calidad:** En Scrum, la calidad se define como la capacidad con la que cuenta el producto o los entregables para cumplir con los criterios de aceptación y de alcanzar el valor de negocio que el cliente espera.
- **4. Cambio:** Es importante que los miembros del equipo del proyecto entiendan que los procesos de desarrollo de Scrum están diseñados para aceptar el cambio.
- **5. Riesgo:** El riesgo se define como un evento incierto o serie de eventos que pueden afectar los objetivos de un proyecto y pueden contribuir a su éxito o fracaso. A los riesgos que pueden tener un impacto positivo en el proyecto se les conoce como oportunidades, mientras que las amenazas son riesgos que pudieran afectar negativamente al proyecto.

Procesos de scrum

Capítulo	Fase	Procesos fundamentales de Scrum
8	Inicio	1. Crear la visión del proyecto 2. Identificar al Scrum Master y a los interesados del negocio 3. Formar Equipos Scrum 4. Desarrollar épicas 5. Crear el backlog priorizado del producto 6. Realizar la planificación de la liberación
9	Planificación y estimación	7. Crear historias de usuario 8. Estimar historias de usuario 9. Comprometer historias de usuario 10. Identificar tareas 11. Estimar tareas 12. Actualizar el backlog del sprint
10	Implementación	13. Crear entregables 14. Realizar el Daily Standup 15. Refinar el backlog priorizado del producto
11	Revisión y retrospectiva	16. Demostrar y validar el sprint 17. Retrospectiva del sprint
12	Liberación	18. Enviar entregables 19. Retrospectiva de la liberación

Tabla 1-1: Resumen de los procesos fundamentales de Scrum

Procesos de scrum

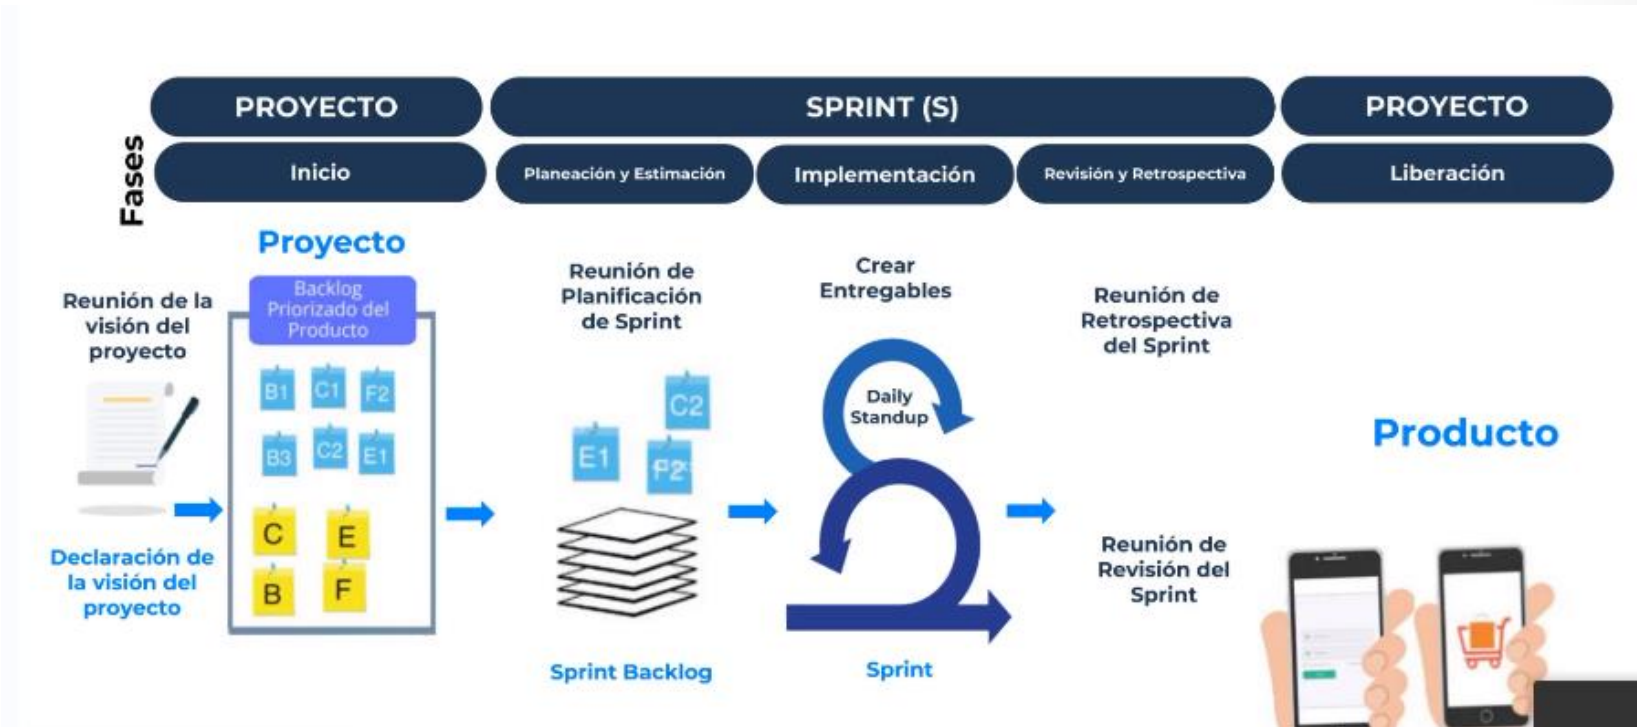

Procesos de scrum

Fase de inicio

- 1. *Crear la visión del proyecto*: En este proceso se revisa el caso de negocio del proyecto a fin de crear una Declaración de la visión del proyecto, que servirá de inspiración y proporcionará un enfoque para todo el proyecto. En este proceso se identifica al Product Owner.
- 2. *Identificar al Scrum Master y a los interesados del negocio*: En este proceso se identifica al Scrum Master y a los interesados del negocio utilizando criterios de selección específicos.
- 3. *Formar Equipos Scrum*: En este proceso se identifican a los miembros del Equipo Scrum.
- 4. *Desarrollar épicas*: En este proceso, la declaración de visión del proyecto sirve como base para el desarrollo de épicas. Se pueden llevar a cabo reuniones de grupos de usuarios para hablar sobre las épicas adecuadas.
- 5. *Crear el backlog priorizado del producto*: En este proceso se refinan y se crean las épicas, y después se priorizan para crear un backlog priorizado del producto en el proyecto.
- 6. *Realizar la planificación de la liberación*: En este proceso el equipo principal de Scrum revisa las historias de usuario en el backlog priorizado del producto para desarrollar un cronograma de planificación de la liberación

Procesos de scrum

Fase de planificación y estimación

- 7. *Crear historias de usuario*: En este proceso se crean las historias de usuario y los criterios de aceptación de las historias de usuario. Las historias de usuario están diseñadas para asegurar que los requisitos del cliente estén claramente representados y puedan ser plenamente comprendidos por todos los interesados del negocio.
- 8. *Estimar historias de usuario*: En este proceso, el Product Owner explica las historias de usuario para que el Scrum Master y el Equipo Scrum puedan estimar el esfuerzo necesario para desarrollar la funcionalidad descrita en cada historia de usuario.
- 9. *Comprometer historias de usuario*: En este proceso, el Equipo Scrum se compromete a entregar las historias de usuario aprobadas para un sprint.
- 10. *Identificar tareas*: En este proceso, las historias de usuario comprometidas se desglosan en tareas específicas y se compilan en una lista de tareas.
- 11. *Estimar tareas*: En este proceso, el equipo principal de Scrum estima el esfuerzo necesario para cumplir con cada tarea en la lista de tareas.
- 12. *Actualizar el backlog del sprint*: En este proceso, el equipo principal de Scrum elabora un backlog del sprint que contiene todas las tareas a ser completadas en un sprint como parte de la reunión de planificación del sprint.

Procesos de scrum

Fase de implementación

- 13. *Crear entregables*: En este proceso, el Equipo Scrum trabaja en las tareas en el backlog del sprint para crear los entregables del sprint.
- 14. *Realizar el Daily Standup*: En este proceso, se lleva a cabo diariamente una reunión altamente focalizada con un time-box, conocida como Daily Standup. Es aquí donde los miembros del Equipo Scrum se actualizan el uno al otro referente a sus progresos y sobre los impedimentos que pudieran enfrentar.
- 15. *Refinar el backlog priorizado del producto*: En este proceso, el backlog priorizado del producto se actualiza y se refina continuamente.

Procesos de scrum

Fase de revisión y retrospectiva

- 16. *Demostrar y validar el sprint:* En este proceso, el Equipo Scrum muestra los entregables del sprint al Product Owner y a los interesados del negocio relevantes en una reunión de revisión del sprint. El objetivo de esta reunión es asegurar que el Product Owner apruebe y acepte las historias de usuario del sprint.
- 17. *Retrospectiva del sprint:* En este proceso, el Scrum Master y el Equipo Scrum se reúnen para analizar las lecciones aprendidas durante todo el Sprint.

Fase de liberación

- 18. *Enviar entregables:* En este proceso, los entregables aceptados se entregan o se envían a los interesados del negocio relevantes.
- 19. *Retrospectiva de la liberación:* En este proceso, mismo que concluye el proyecto, los interesados del negocio y miembros del equipo principal de Scrum se reúnen para reflexionar sobre el proyecto e identificar, documentar e internalizar las lecciones aprendidas.

Backlog

5. Backlog priorizado del producto*

- El Product Owner desarrolla un backlog priorizado del producto que contiene una lista priorizada de los requerimientos del negocio y de los proyectos en forma de épicas (historias de usuario de alto nivel). El backlog priorizado del producto se basa en tres factores principales: valor, riesgo o incertidumbre y dependencias.

12. El backlog priorizado del producto es una lista dinámica que se actualiza constantemente debido a la repriorización de historias de usuarios nuevas, actualizadas, refinadas y en ocasiones eliminadas. Tales actualizaciones al backlog son generalmente el resultado de cambios en los requerimientos del negocio.

Backlog del sprint*

- A la lista de tareas que desarrollará el Equipo Scrum en el siguiente sprint se le llama backlog del sprint. Es un subconjunto del backlog priorizado del producto e incluye las historias de usuario comprometidas que se asignan a un sprint específico. Esto se refina más con detalles a nivel de cada tarea a medida que avanza la planificación del sprint.

Tareas

tareas

- En este proceso, las historias de usuario comprometidas se desglosan en tareas específicas y se compilan en una **lista de tareas**. La identificación de tareas se puede hacer al inicio del sprint en todas las historias de usuario comprometidas o antes de que el equipo empiece a trabajar en las tareas requeridas en cada historia de usuario.

HISTORIAS DE USUARIO	TAREAS		
	Por hacer	En progreso	Terminada
1			
2			
3			
4			

Figura 9-13: Scrumboard con tareas identificadas

Bibliografía

- Guía de los FUNDAMENTOS DE SCRUM (GUÍA DEL SBOK®).
Cuarta Edición
